Nøvling Skole

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1		**Behovsafklaring byggeudvalg**	**34 dage**	**ti 01-03-16**	**on 20-04-16**	
4		**Rådgiverudbud**	**24 dage**	**to 21-04-16**	**ma 30-05-16**	
5		Udbud	13 dage	to 21-04-16	to 12-05-16	3
6		Evaluering	8 dage	fr 13-05-16	on 25-05-16	5
7		Aftaleindgåelse	3 dage	to 26-05-16	ma 30-05-16	6
8		**Dispositionsforslag**	**75 dage**	**ti 31-05-16**	**ti 04-10-16**	
9		Afklaring og udarbejdelse	55 dage	ti 31-05-16	ti 06-09-16	7
10		Byggeudvalgets godkendelse	10 dage	on 07-09-16	ti 20-09-16	9
11		Udvalgsforberedelse	9 dage	on 21-09-16	ma 03-10-16	10
12		Godkendelse i Skoleudvalg	1 dag	ti 04-10-16	ti 04-10-16	11
13		**Projektforslag**	**30 dage**	**on 05-10-16**	**ti 22-11-16**	
14		Udarbejdelse	20 dage	on 05-10-16	ti 08-11-16	12
15		Byggeudvalgets godkendelse	10 dage	on 09-11-16	ti 22-11-16	14
16		**Forprojekt**	**20 dage**	**on 23-11-16**	**ti 20-12-16**	
17		Udarbejdelse	15 dage	on 23-11-16	ti 13-12-16	15
18		Byggeudvalgets godkendelse	5 dage	on 14-12-16	ti 20-12-16	17
19		**Hovedprojekt**	**40 dage**	**on 21-12-16**	**ti 14-02-17**	
20		Udarbejdelse	35 dage	on 21-12-16	ti 07-02-17	18
21		Byggeudvalgets godkendelse	5 dage	on 08-02-17	ti 14-02-17	20
22		**Licitation**	**25 dage**	**on 15-02-17**	**ti 21-03-17**	
23		Tilbudsperiode	15 dage	on 15-02-17	ti 07-03-17	21
24		Godkendelse af licitation	5 dage	on 08-03-17	ti 14-03-17	23
25		Kontraktindgåelse	5 dage	on 15-03-17	ti 21-03-17	24
26		**Udførelse**	**194 dage**	**on 22-03-17**	**ma 18-12-17**	
27		Udførelse	180 dage	on 22-03-17	ti 28-11-17	25
28		Indflytning endeligt	14 dage	on 29-11-17	ma 18-12-17	27

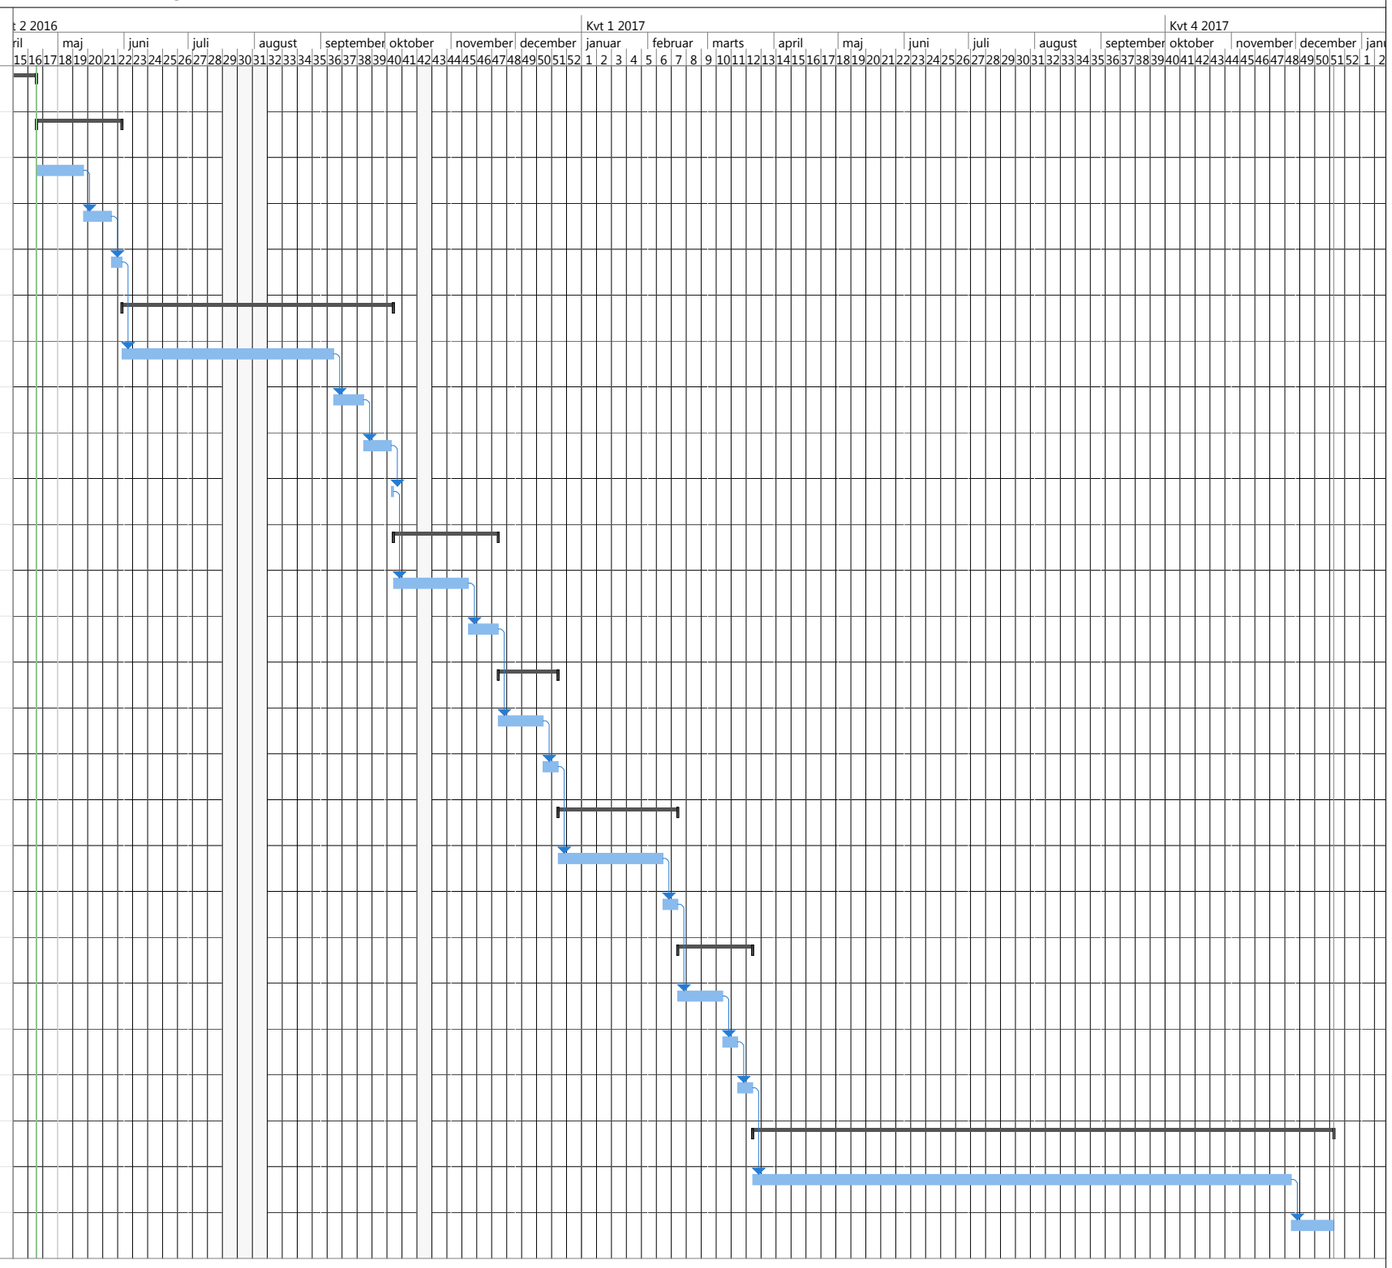

to 21-04-16

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	
